



**ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПАРКА ПО АДРЕСУ:
Г. НОВОДВИНСК, ДЕТСКИЙ ПАРК**

**Муниципальное образование «Город Новодвинск»
01 июля 2018 года**

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА ПО АДРЕСУ: Г. НОВОДВИНСК, ДЕТСКИЙ ПАРК

Основание для выполнения работ:
Муниципальный контракт: от 15.05.2018 № 44.

Заказчик: Администрация муниципального образования «Город Новодвинск» (ИНН 2903001697)

Руководитель заказчика: Андреев Сергей Федорович, глава муниципального образования «Город Новодвинск», (8818-52) 5-12-92, e-mail: admin@novadmin.ru.

Контактное лицо заказчика: Расторгуев Игорь Анатольевич, начальник отдела инфраструктурного развития управления инфраструктурного развития и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Город Новодвинск», (8818-52) 5-12-92, i.rastorguev@novadmin.ru.

Подрядная организация: ООО «Атлант-С» (ИНН 2901282241)

Руководитель подрядчика: Шаньгин Алексей Александрович, генеральный директор, 8-964-301-88-50, arhatlant-c@mail.ru.

Контактное лицо подрядчика: Капитула Вячеслав Иванович, 8-964-301-88-50, slkap@yandex.ru.

Сроки выполнения работ:
Начало – 15.05.2018.
Окончание – 15.08.2018.



**БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА
ПО АДРЕСУ: Г. НОВОДВИНСК, ДЕТСКИЙ ПАРК
(ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)**

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя
Правительства Архангельской области

_____ А.Г. Шестаков

График производства работ по муниципальному контракту от 15.05.2018 № 0124300009418000044
(указать реквизиты МК)

заключенному между администрацией муниципального образования "Город Новодвинск"

и ООО "Атлант-С"
(указать наименование подрядной организации)

Вид территории (-ий) (дворовая, общественная, парк) _____ Детский парк

Адрес (-а) территории (-ий) _____ г.Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д.27

| № п/п | Наименование работ (укрупненно) | Дата начала проведения работ | Дата завершения работ |
|--|--|------------------------------|-----------------------|
| Благоустройство детского парка за зданием по ул. 50-летия Октября, д.27 | | | |
| 1 | Разработка грунта, разметка территории | 21.05.2018 | 25.05.2018 |
| 2 | Установка бортовых камней | 28.05.2018 | 09.06.2018 |
| 3 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала | 08.06.2018 | 09.06.2018 |
| 4 | Устройство песчаного основания под укладку тротуарной плитки | 08.06.2018 | 15.06.2018 |

**БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА
ПО АДРЕСУ: Г. НОВОДВИНСК, ДЕТСКИЙ ПАРК
(ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)**

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| 5 | Устройство покрытий из тротуарной плитки | 18.06.2018 | 20.07.2018 |
| 6 | Чеканка и затирка швов. Окончание работ. | 23.07.2018 | 31.07.2018 |

Дата составления: 17.05.2018

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы муниципального образования «Город
Новодвинск» по инфраструктурному развитию и жилищно-
коммунальному хозяйству



М.Б. Хвостюк

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО «Атлант-С»



А.А. Шаньгин



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПАРКА ПО АДРЕСУ: Г. НОВОДВИНСК, ДЕТСКИЙ ПАРК



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПАРКА ПО АДРЕСУ: Г. НОВОДВИНСК, ДЕТСКИЙ ПАРК


| № п/п | Виды работ | Объем работ, ед. изм. | Стоимость работ, тыс. рублей |
|-------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | Устройство тротуарной плитки | 433 кв. м | 1050.366 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |



ФОТООТЧЕТ ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ Г. НОВОДВИНСК, ДЕТСКИЙ ПАРК



ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НОВОДВИНСК, ДЕТСКИЙ ПАРК

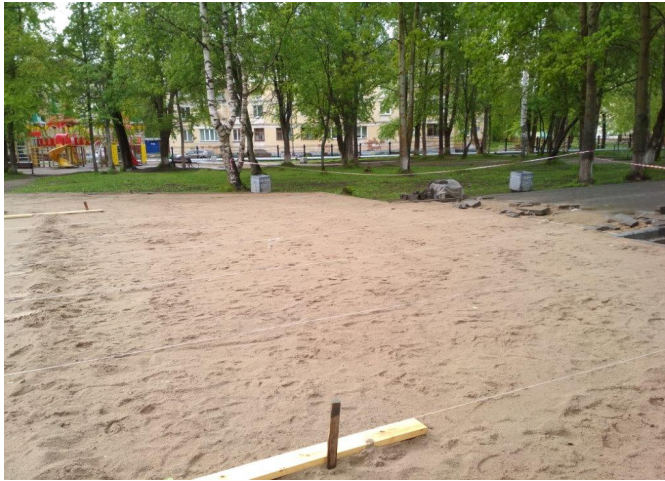

ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НОВОДВИНСК, ДЕТСКИЙ ПАРК



2018



2018



7. 2018



2018



ФОТООТЧЕТ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ Г. НОВОДВИНСК, ДЕТСКИЙ ПАРК



ФОТООТЧЕТ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ РАБОТ Г. НОВОДВИНСК, ДЕТСКИЙ ПАРК



04.07.2018

