



**ул. Фронтовых Бригад**  
**от ул. Двинская – до ул. Декабристов**  
**(км 0+000 - км 2+020)**

Наименование автодороги (административный район)	ул. Фронтových Бригад	
Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева	шир. 1,50м, мат. а/б, 110 - 478	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой	

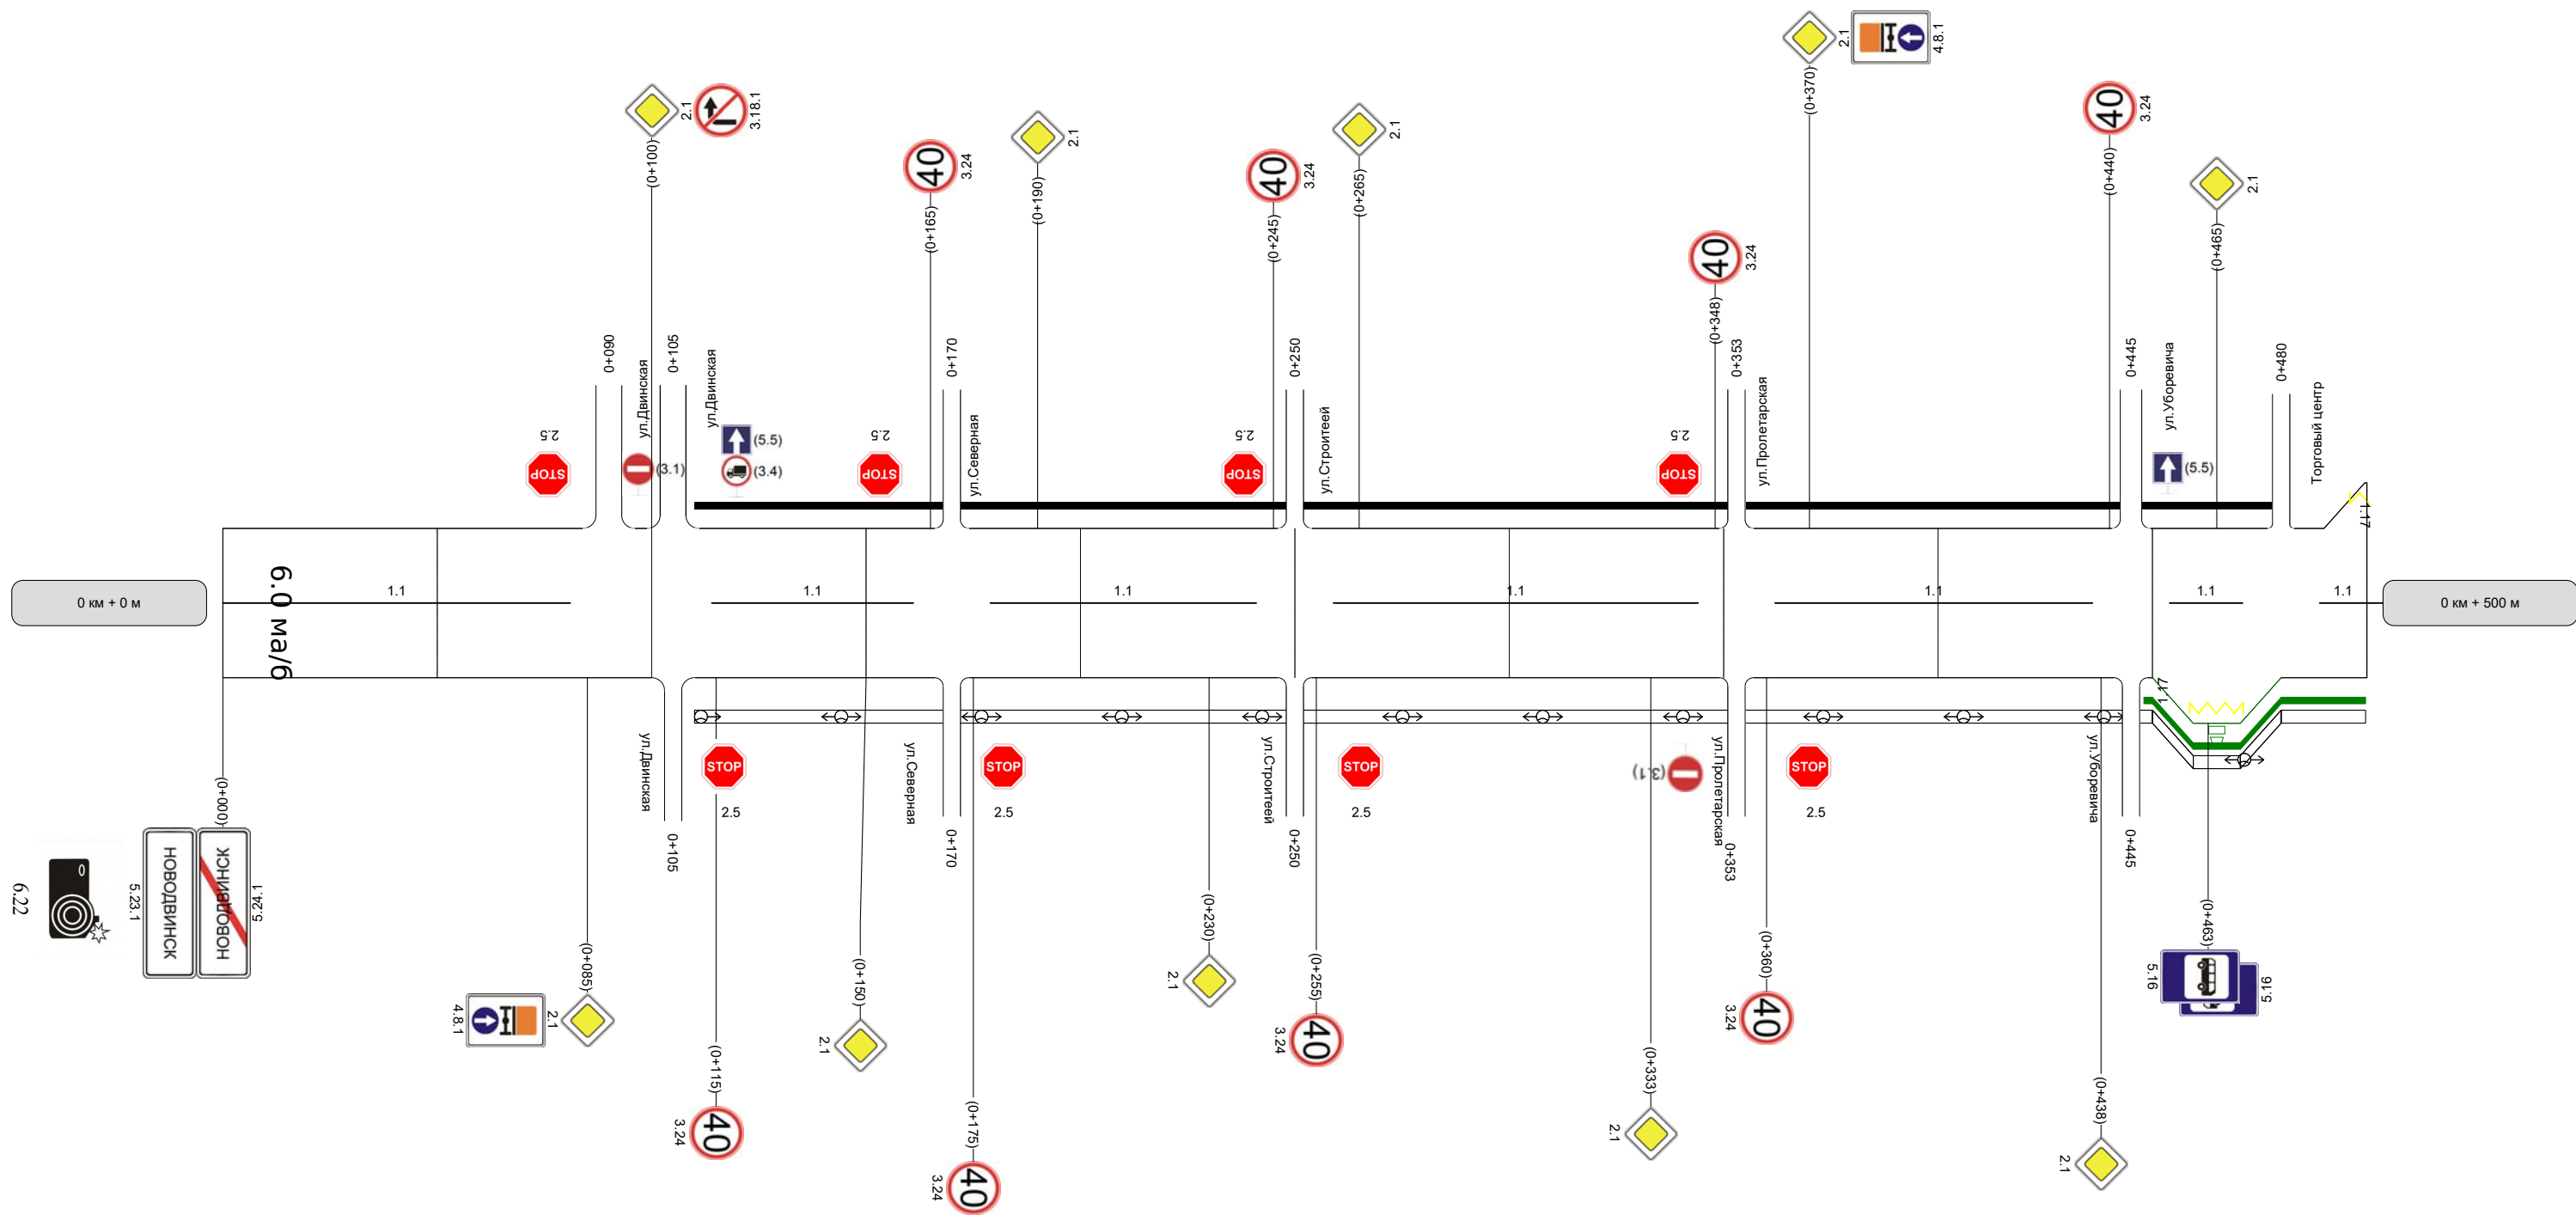


Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 0 - 81	1.1 114 - 161	1.1 179 - 241	1.1 259 - 344	1.1 362 - 436	1.1 454 - 471	1.1 489 - 500
	1-я от осевой						1.17 456 - 467	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа								
Тротуары справа	НД : шир. 1,50м, мат. а/б, 448 - 500							

Наименование автодороги (административный район)	ул. Фронтных Бригад	
Элементы дороги в продольном профиле	500	
Элементы дороги в плане	Тротуары слева	
Тротуары слева	НД : шир. 2,00м, мат. а/б, 510 - 1000	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	1-Я от осевой	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1.17	500 - 507

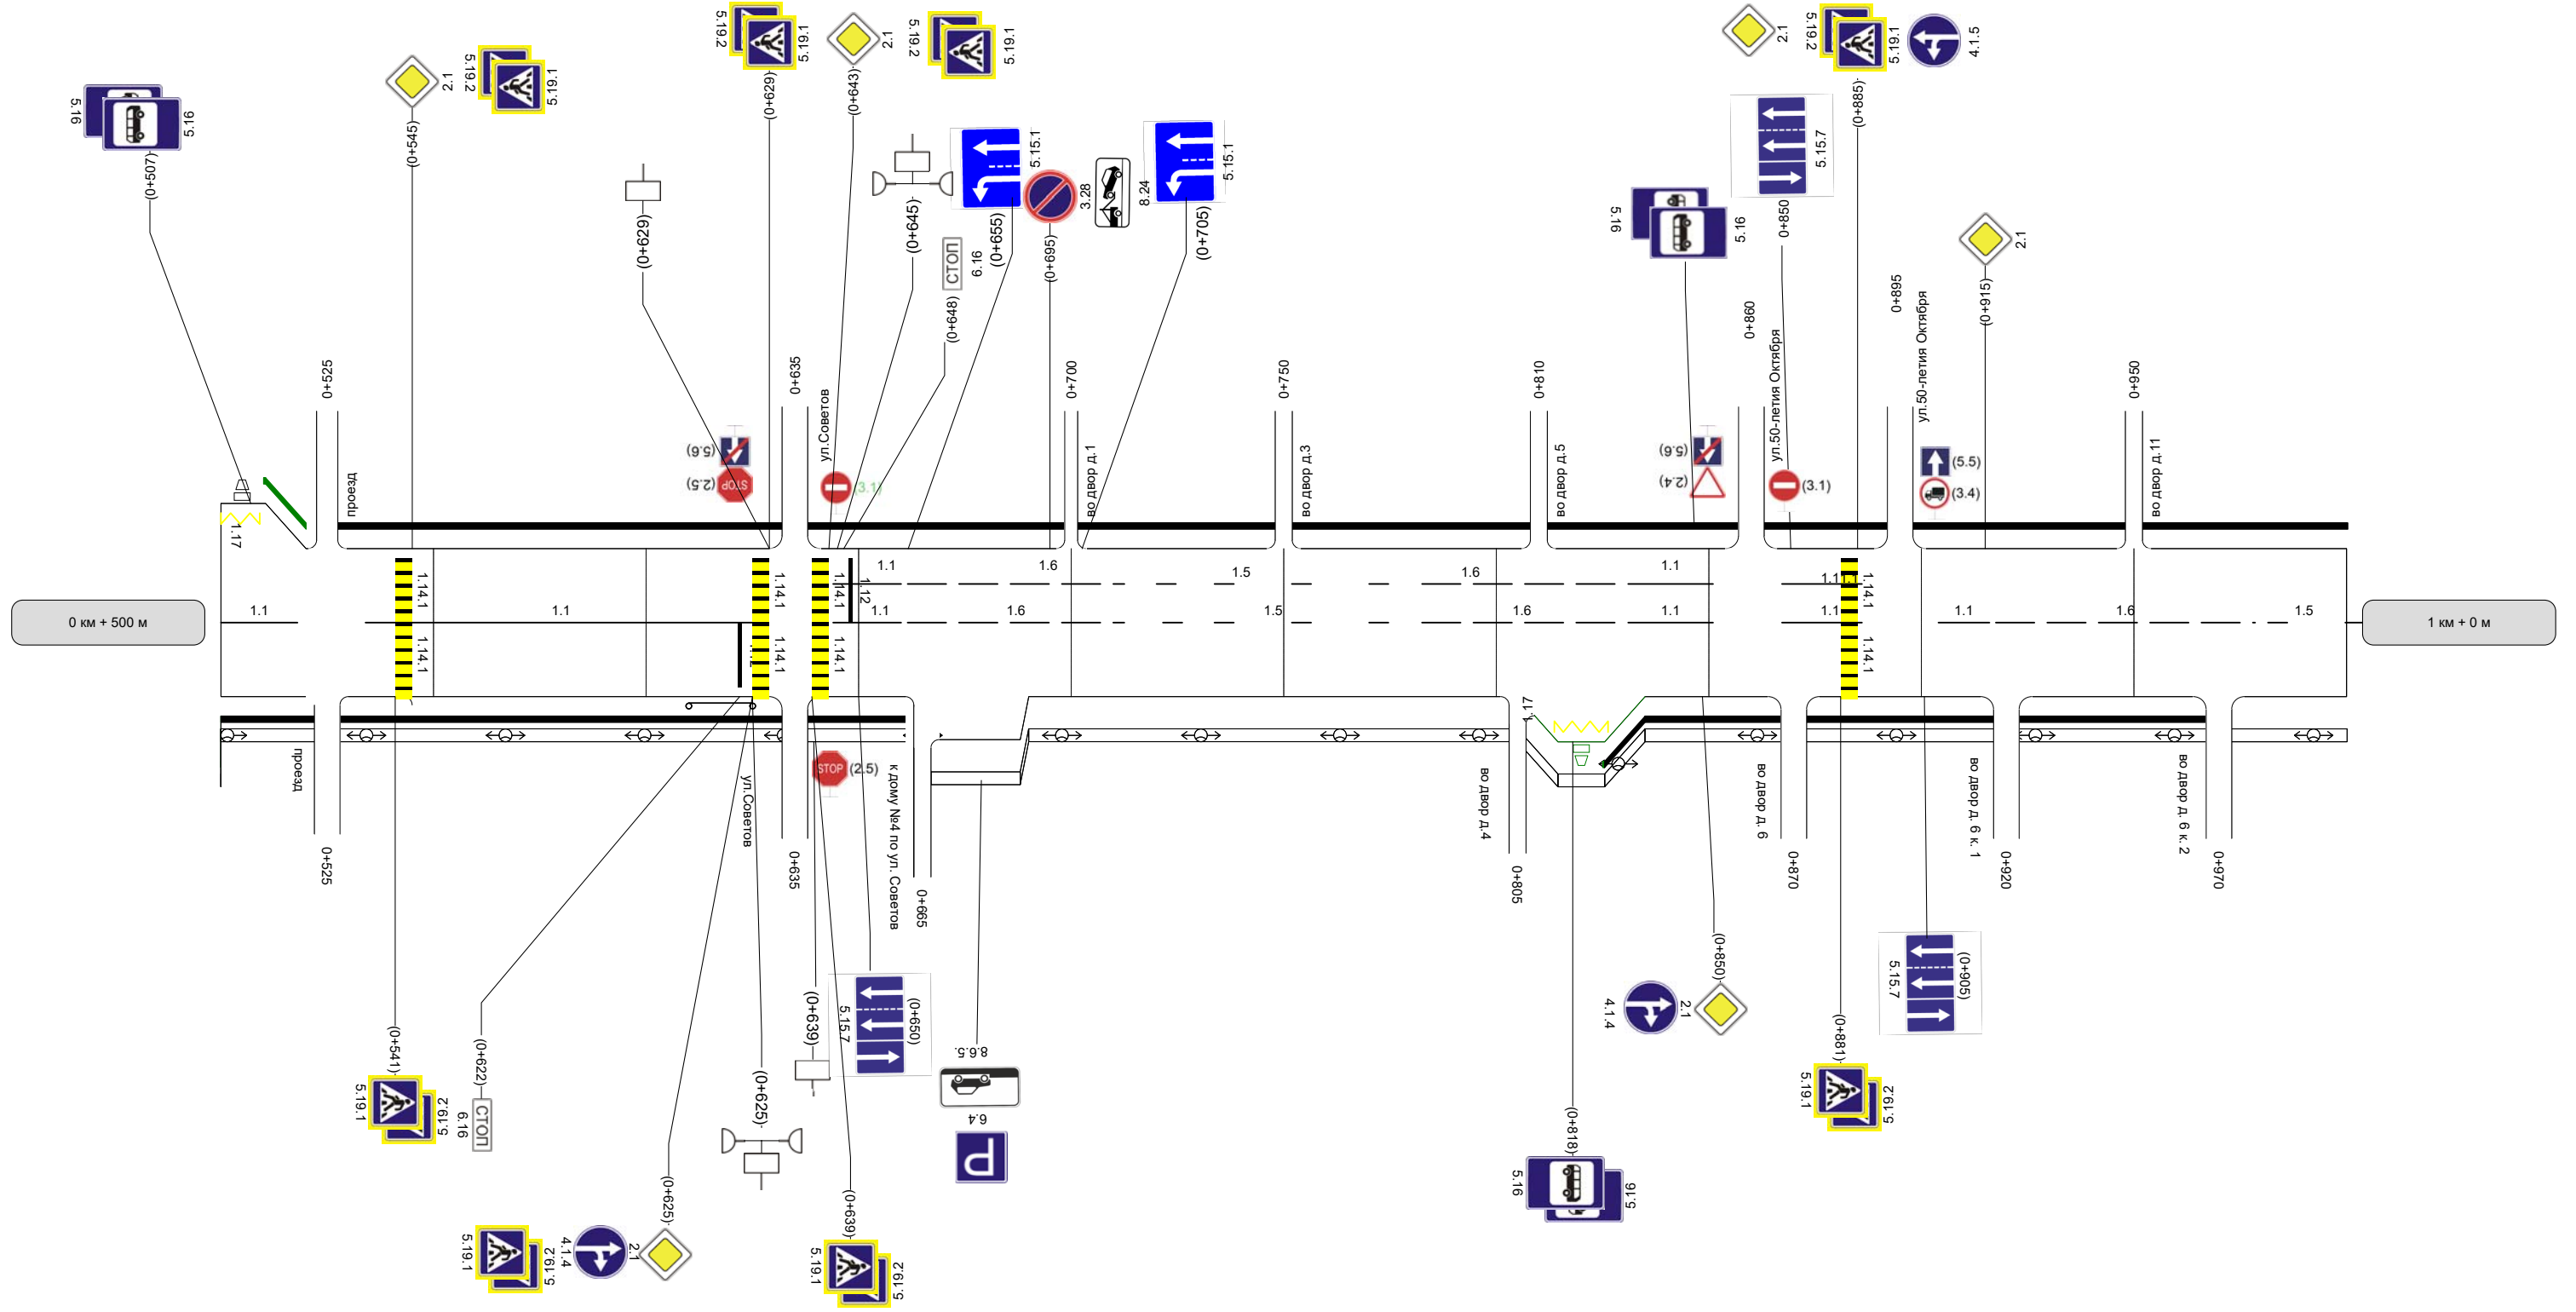


Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 500 - 518	1.1 534 - 626	1.1 644 - 660	1.6 660 - 714	1.5 714 - 781	1.6 781 - 831	1.1 831 - 851	1.1 888 - 904	1.1 904 - 916	1.6 916 - 980	1.5 980 - 1000
	1-ая от осевой								1.17 811 - 822			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	ДО (V - 3) 610 - 625								НД : шир. 2,00м, мат. а/б, 825 - 967			
Тротуары справа	НД : шир. 1,50м, мат. а/б, 500 - 662											

Наименование автодороги (административный район)	ул.Фронтových Бригад
Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	НД : шир. 2,00м, мат. а/б, 0 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой

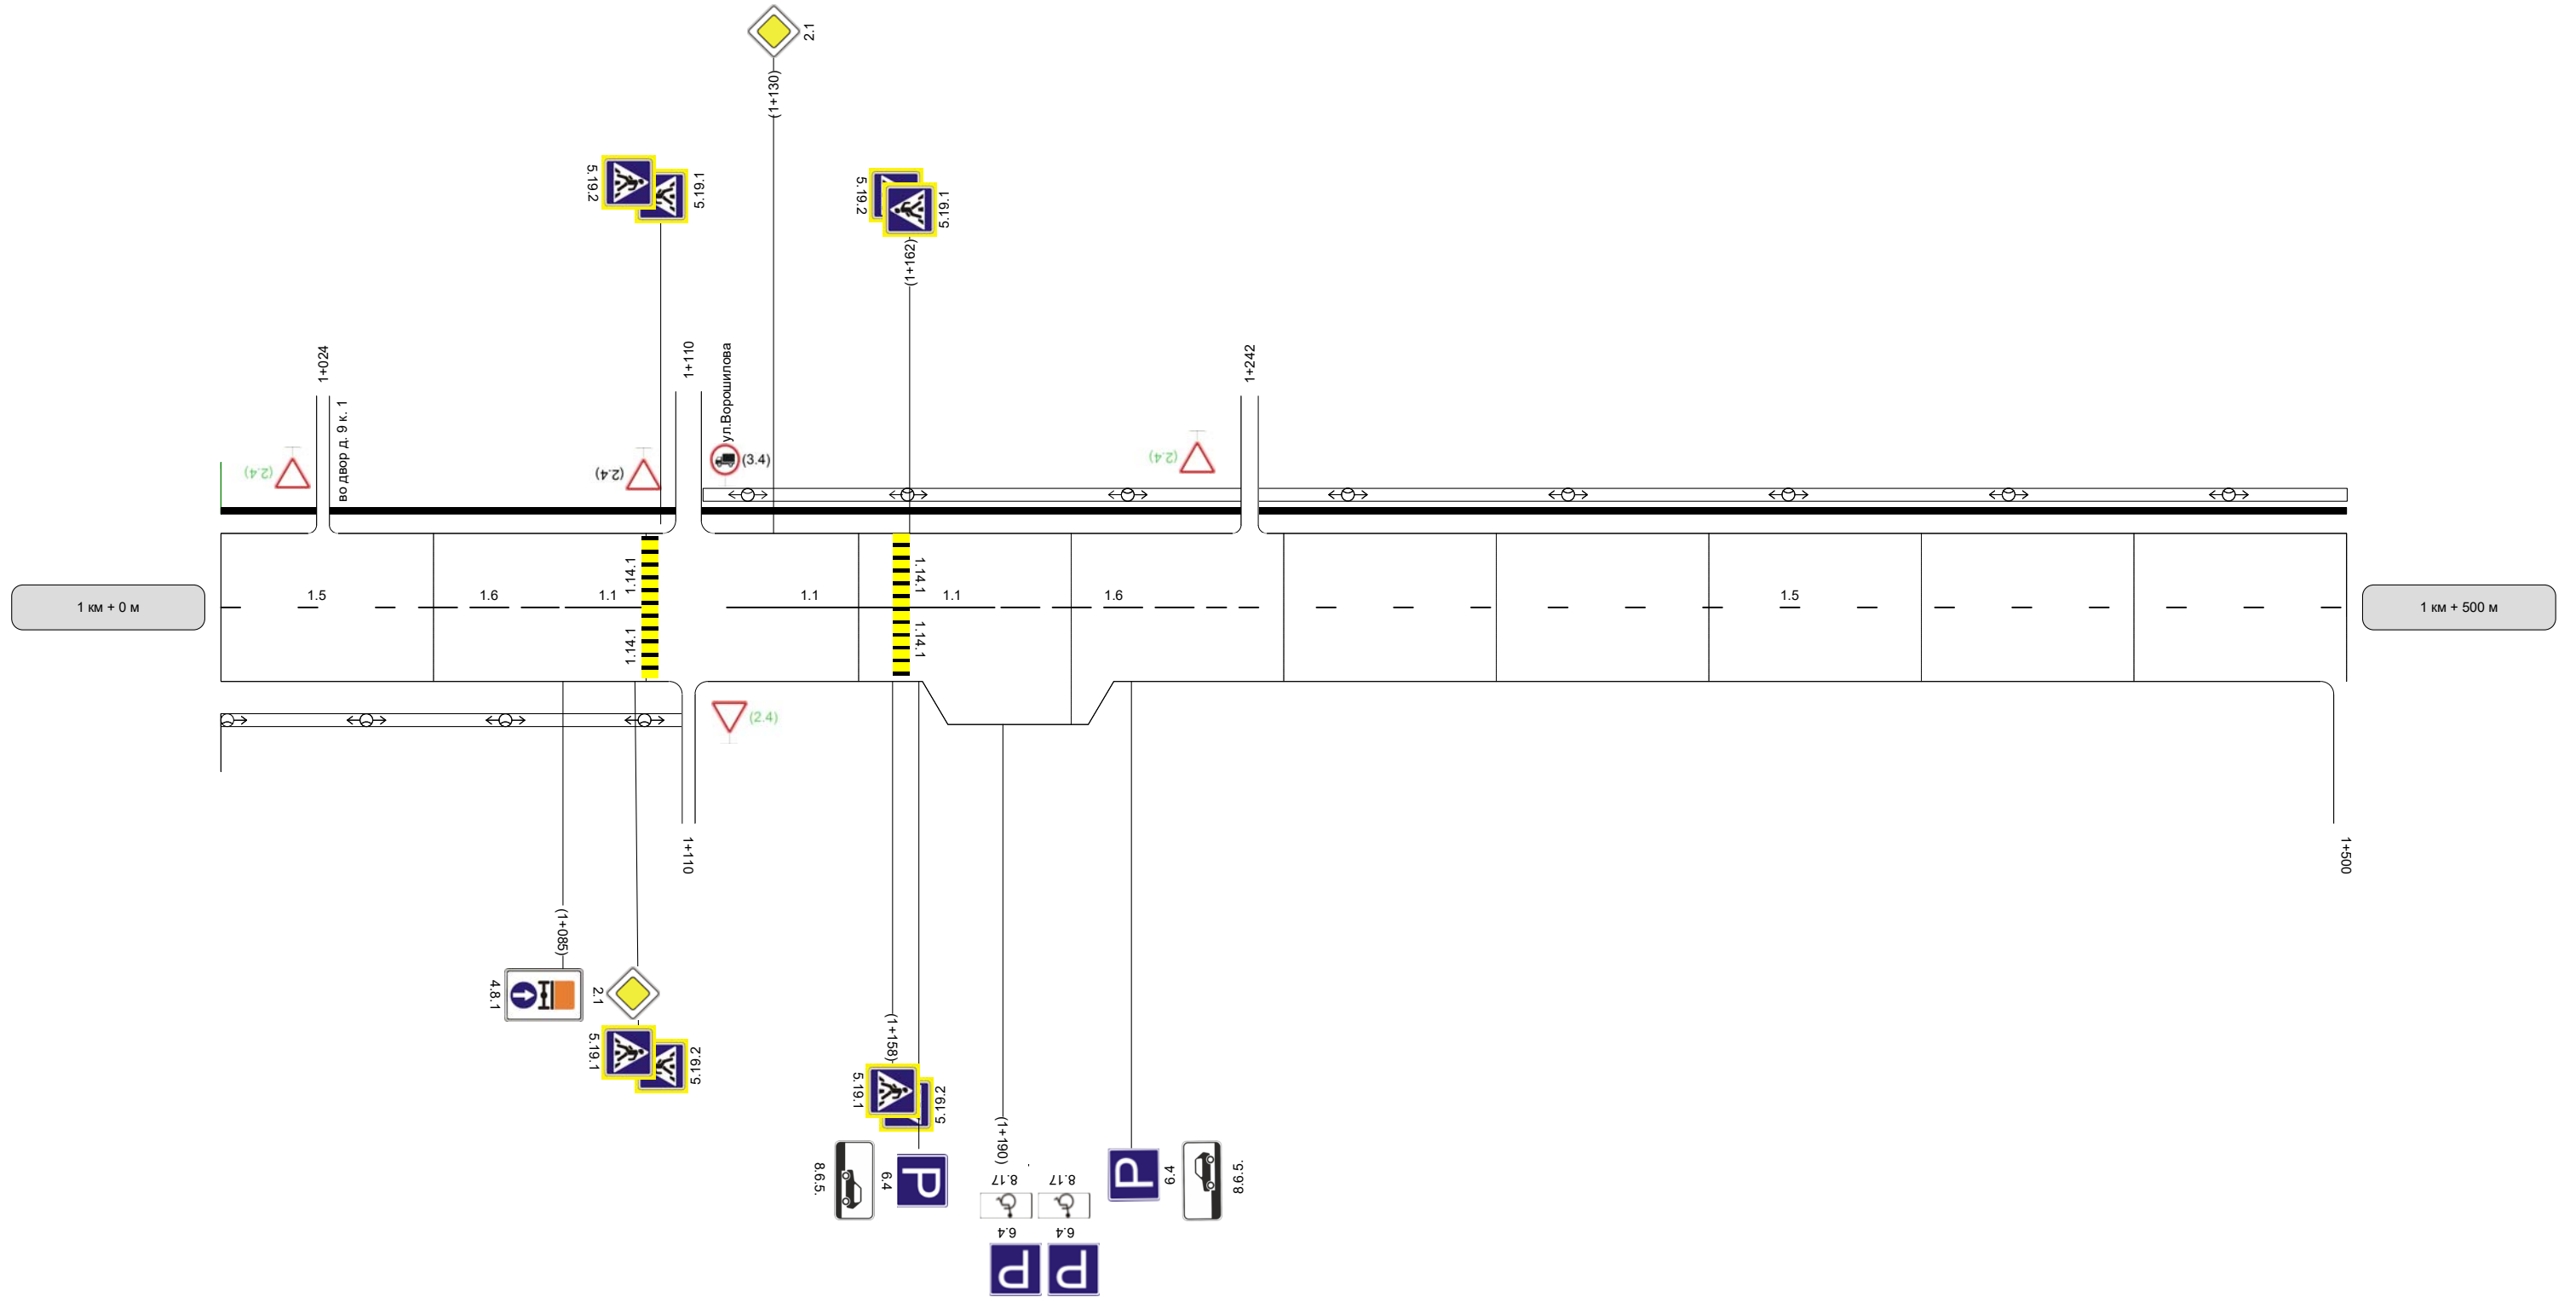

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.5 0 - 45	1.6 45 - 81	1.1 81 - 101	1.1 119 - 158	1.1 162 - 182	1.6 182 - 238	1.5 238 - 500
	1-ая от осевой							
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа								
Тротуары справа								

Наименование автодороги (административный район)	ул. Фронтных Бригад	
Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане	500	
Тротуары слева	НД : шир. 2,00м, мат. а/б, 500 - 1000	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой	1.17 621 - 632
		1.17 921 - 932

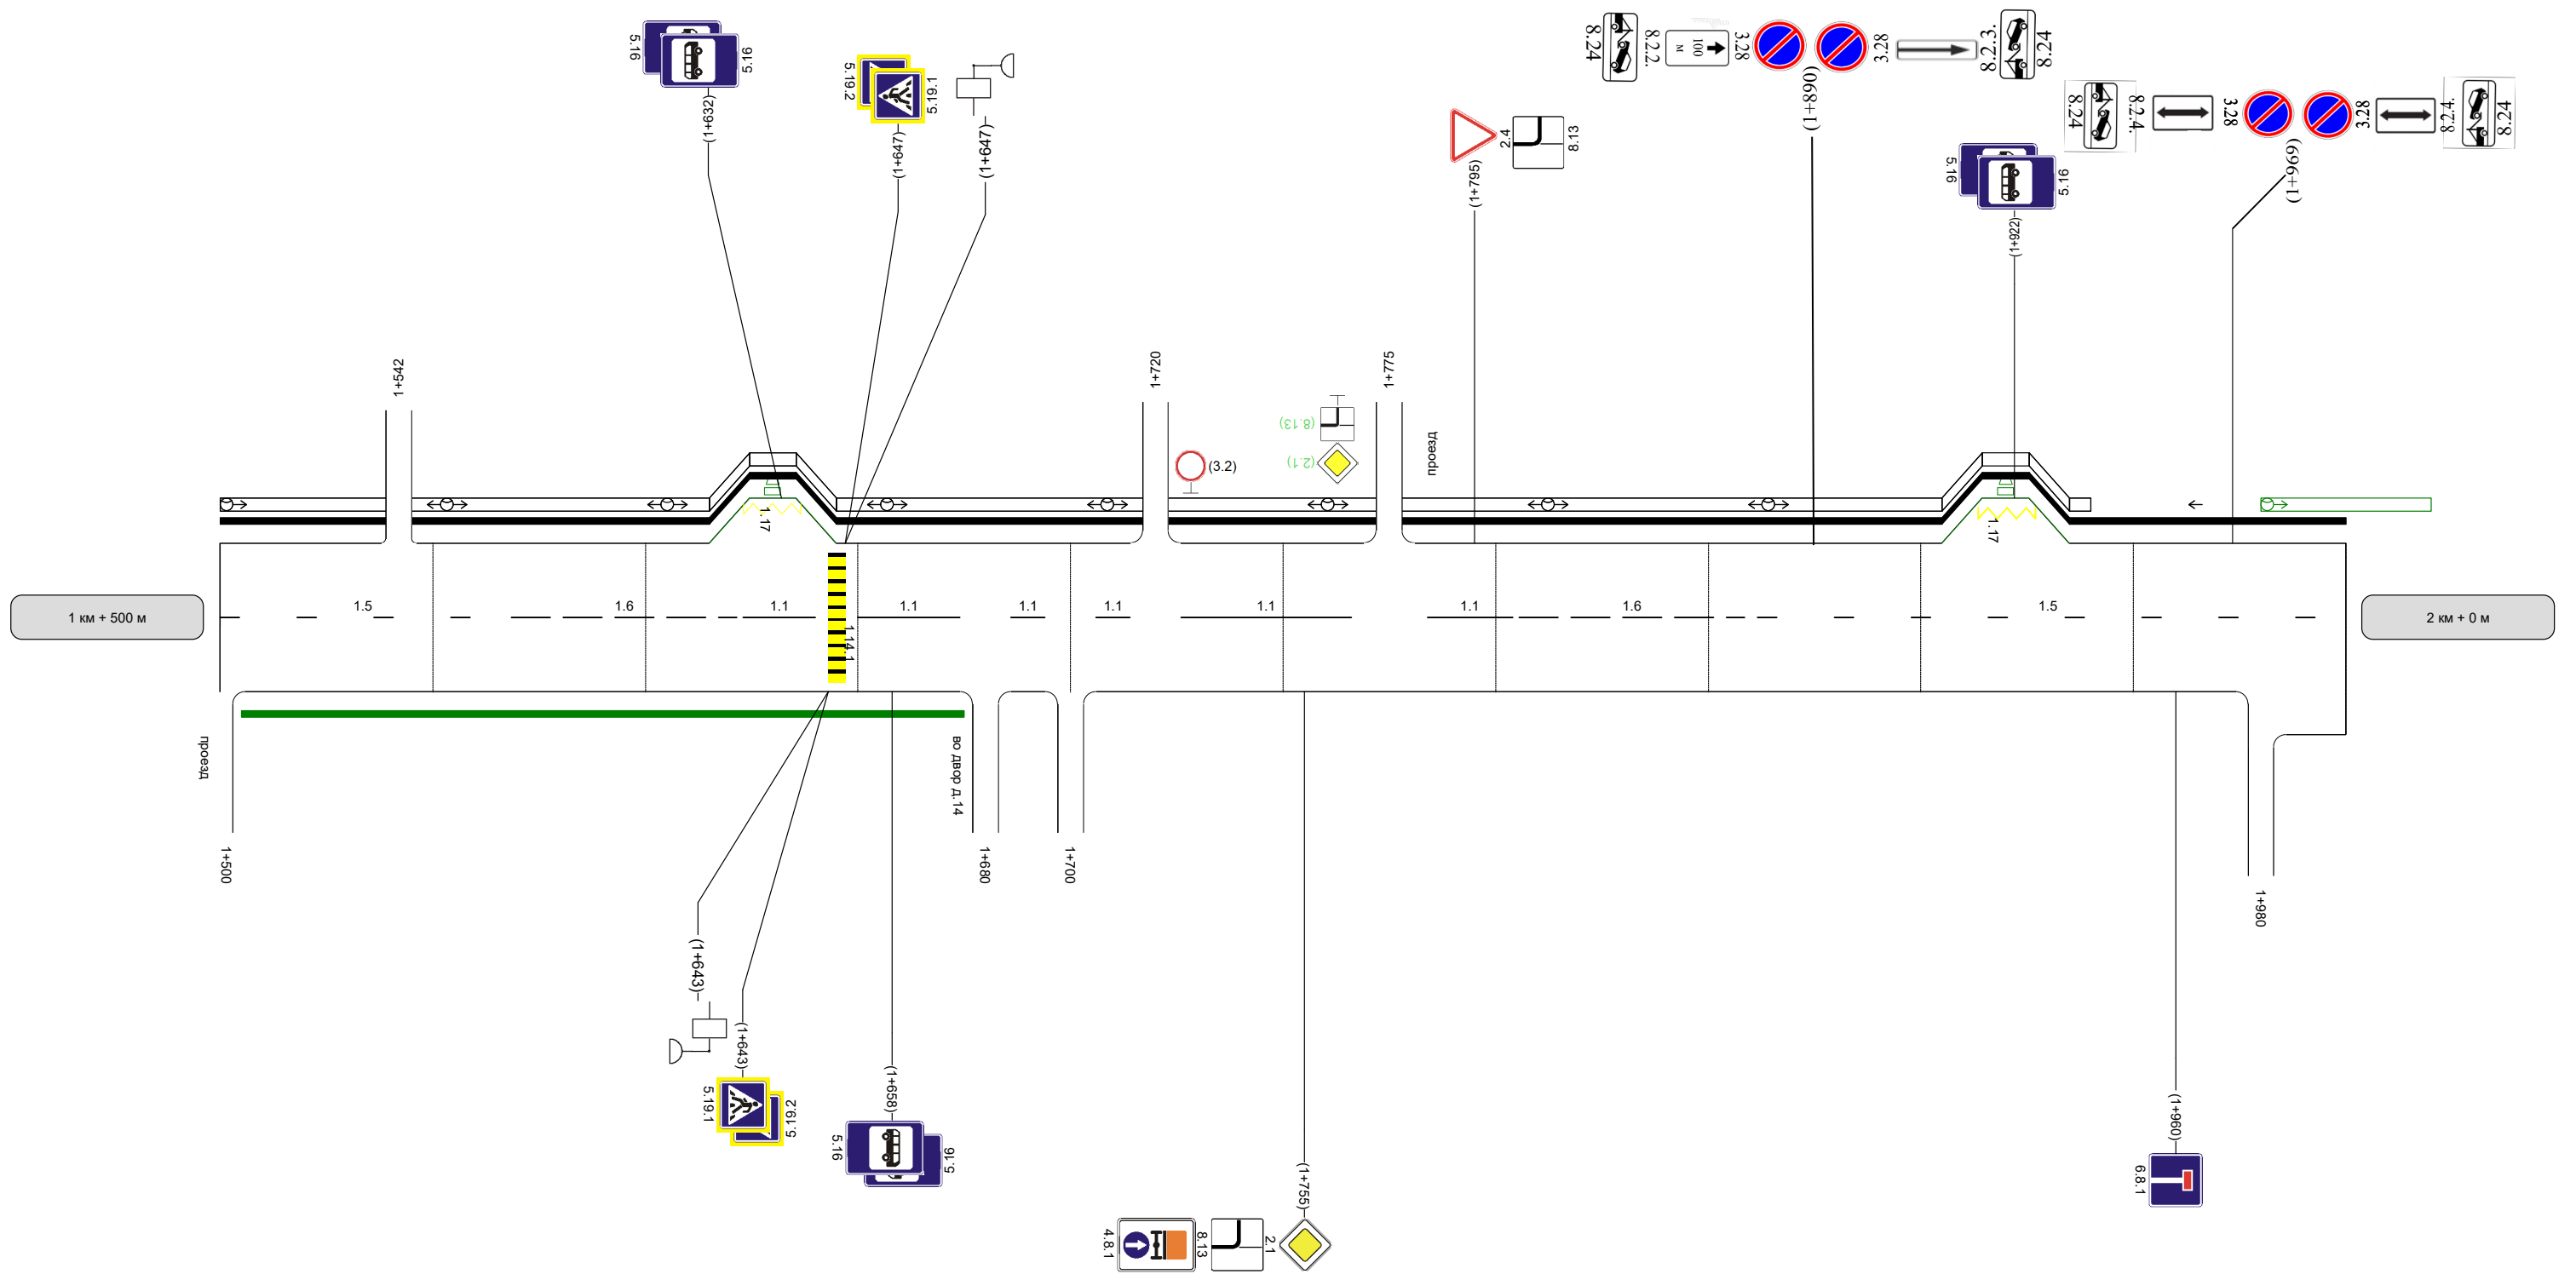

Наименование автодороги (административный район)	ул.Фронтových Бригад
Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой



Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.5 0 - 20
	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

**СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ**

**Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки**

№ км	№ столба+м	1.1	1.5	1.6	1.12	1.14.1	1.17	итога, кв.м.
коэф. привед. к 1.1	коэф. привед. к 1.1	1	0.25	0.75	1	1	1.9	
ширина, м	ширина, м	0.1	0.1	0.1	0.4	4	0.1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1+000	547,00	87,00	168,00	6,00	25,00	45,6	11,06
2	2+000	196,00	514,00	204,00	7,00	14,00	30,4	8,58
2.02	2+020		20,00			7,00		
ИТОГО:		743,00	621,00	372,00	13,00	46,00	76,00	19,64
лин.км.		0,743	0,621	0,372	0,013	0,046	0,076	
привед.км.		0,743	0,155	0,279	0,013	0,046	0,144	
площадь		74,3	15,5	27,9	5,20	184	14,44	321,24

**Ведомость размещения дорожных знаков**

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Предупреждающие знаки</b>							
		<b>Итого установлено:</b>					0		
		<b>Итого временных:</b>					0		
		<b>Итого демонтировать:</b>					0		
		<b>Итого требуется:</b>					0		
		<b>Итого:</b>					0		
		<b>Знаки приоритета</b>							
1	2.1	Главная дорога	2		0+085	требуется установить	1	справа	
2	2.1	Главная дорога	2		0+100	требуется установить	1		слева
3	2.1	Главная дорога	2		0+150	требуется установить	1	справа	
4	2.1	Главная дорога	2		0+190	установлено	1		слева
5	2.1	Главная дорога	2		0+230	установлено	1	справа	
6	2.1	Главная дорога	2		0+265	установлено	1		слева
7	2.1	Главная дорога	2		0+333	установлено	1	справа	
8	2.1	Главная дорога	2		0+370	установлено	1		слева
9	2.1	Главная дорога	2		0+438	установлено	1	справа	
10	2.1	Главная дорога	2		0+465	требуется установить	1		слева
11	2.1	Главная дорога	2		0+545	требуется установить	1		слева
12	2.1	Главная дорога	2		0+625	требуется установить	1	справа	
13	2.1	Главная дорога	2		0+643	требуется установить	1		слева
14	2.1	Главная дорога	2		0+850	требуется установить	1	справа	
15	2.1	Главная дорога	2		0+885	требуется установить	1		слева
16	2.1	Главная дорога	2		0+900	демонтировать	1		слева
17	2.1	Главная дорога	2		0+915	требуется установить	1		слева
18	2.1	Главная дорога	2		1+130	требуется установить	1		слева
19	2.1	Главная дорога	2		1+162	демонтировать	1		слева
20	2.1	Главная дорога	2		1+755	установлено	1	справа	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	2.1	Главная дорога	2		1+775	требуется установить	1		примыкание слева
22	2.1	Главная дорога	2		1+820	демонтировать	1		слева
23	2.4	Уступите дорогу	2		0+090	установлено	1		примыкание слева
24	2.4	Уступите дорогу	2		0+105	установлено	1	примыкание справа	
25	2.4	Уступите дорогу	2		0+170	установлено	1		примыкание слева
26	2.4	Уступите дорогу	2		0+170	установлено	1	примыкание справа	
27	2.4	Уступите дорогу	2		0+250	установлено	1		примыкание слева
28	2.4	Уступите дорогу	2		0+250	установлено	1	примыкание справа	
29	2.4	Уступите дорогу	2		0+353	требуется установить	1		примыкание слева
30	2.4	Уступите дорогу	2		0+353	установлено	1	примыкание справа	
31	2.4	Уступите дорогу	2		0+860	установлено	1		примыкание слева
32	2.4	Уступите дорогу	2		1+024	требуется установить	1		примыкание слева
33	2.4	Уступите дорогу	2		1+110	требуется установить	1	примыкание справа	
34	2.4	Уступите дорогу	2		1+110	установлено	1		примыкание слева
35	2.4	Уступите дорогу	2		1+242	требуется установить	1		примыкание слева
36	2.4	Уступите дорогу	2		1+795	требуется установить	1		слева
37	2.5	Движение без остановки запрещено	2		0+635	установлено	1		примыкание слева
38	2.5	Движение без остановки запрещено	2		0+635	установлено	1	примыкание справа	
<b>Итого установлено:</b>							18		
<b>Итого временных:</b>							0		
<b>Итого демонтировать:</b>							3		
<b>Итого требуется:</b>							17		
<b>Итого:</b>							35		
<b>Запрещающие знаки</b>									
39	3.1	Въезд запрещен	2		0+090	установлено	1		примыкание слева
40	3.1	Въезд запрещен	2		0+635	требуется установить	1		примыкание слева
41	3.1	Въезд запрещен	2		0+860	установлено	1		примыкание слева
42	3.1	Въезд запрещен	2		2+015	требуется установить	1	справа	
43	3.2	Движение запрещено	2		1+720	установлено	1		примыкание слева
44	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+105	установлено	1		примыкание слева
45	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+895	установлено	1		примыкание слева



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		1+110	установлено	1		примыкание слева
47	3.18.1	Поворот направо запрещен	2		0+100	требуется установить	1		слева
48	3.18.1	Поворот направо запрещен	2		0+885	требуется установить	1		слева
49	3.18.2	Поворот налево запрещен	2		0+850	требуется установить	1	справа	
50	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+115	требуется установить	1	справа	
51	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+165	установлено	1		слева
52	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+175	установлено	1	справа	
53	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+245	установлено	1		слева
54	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+255	установлено	1	справа	
55	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+348	требуется установить	1		слева
56	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+360	требуется установить	1	справа	
57	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+440	установлено	1		слева
58	3.27	Остановка запрещена	2		1+930	демонтировать	1		слева
59	3.27	Остановка запрещена	2		1+963	требуется установить	1		слева
60	3.27	Остановка запрещена	2		1+999	требуется установить	1		слева
61	3.27	Остановка запрещена	2			установлено	6		слева
62	3.28	Стоянка запрещена	2		0+695	установлено	1		слева
		<b>Итого установлено:</b>					12		
		<b>Итого временных:</b>					0		
		<b>Итого демонтировать:</b>					1		
		<b>Итого требуется:</b>					10		
		<b>Итого:</b>					22		
		<b>Предписывающие знаки</b>							
63	4.1.4	Движение прямо или направо	2		0+625	требуется установить	1	справа	
64	4.1.5	Движение прямо или налево	2		0+643	требуется установить	1		слева
65	4.8.1	Направление движения транспортных средств с опасными грузами	2		0+085	требуется установить	1	справа	
66	4.8.1	Направление движения транспортных средств с опасными грузами	2		0+370	требуется установить	1		слева
67	4.8.1	Направление движения транспортных средств с опасными грузами	2		0+440	демонтировать	1		слева
68	4.8.1	Направление движения транспортных средств с опасными грузами	2		1+085	установлено	1	справа	
69	4.8.1	Направление движения транспортных средств с опасными грузами	2		1+755	требуется установить	1	справа	
70	4.8.1	Направление движения транспортных средств с опасными грузами	2		1+765	демонтировать	1	справа	
		<b>Итого установлено:</b>					1		
		<b>Итого временных:</b>					0		
		<b>Итого демонтировать:</b>					2		
		<b>Итого требуется:</b>					5		
		<b>Итого:</b>					6		
		<b>Знаки особых предписаний</b>							
71	5.5	Дорога с односторонним движением	2		0+105	установлено	1		примыкание слева
72	5.5	Дорога с односторонним движением	2		0+445	установлено	1		примыкание слева
73	5.6	Конец дороги с односторонним движением	2		0+635	установлено	1		примыкание слева

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	5.6	Конец дороги с односторонним движением	2		0+860	установлено	1		примыкание слева
75	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+463	требуется установить	2	справа	
76	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+475	демонтировать	1	справа	
77	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+507	требуется установить	2		слева
78	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+818	требуется установить	1	справа	
79	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		0+818	установлено	1	справа	
80	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		1+632	установлено	1		слева
81	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		1+632	требуется установить	1		слева
82	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		1+658	требуется установить	2	справа	
83	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		1+922	требуется установить	2		слева
84	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+541	требуется установить	1	справа	
85	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+545	требуется установить	1		слева
86	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+625	требуется установить	1	справа	
87	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+629	требуется установить	1		слева
88	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+639	требуется установить	1	справа	
89	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+643	требуется установить	1		слева
90	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+881	требуется установить	1	справа	
91	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+885	установлено	1		слева
92	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+158	установлено	1	справа	
93	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+162	требуется установить	1		слева
94	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+643	требуется установить	1	справа	
95	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+647	требуется установить	1		слева
96	5.19.1	Пешеходный переход	2		2+015	требуется установить	1	справа	
97	5.19.1	Пешеходный переход	2		2+019	требуется установить	1		слева
98	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+541	требуется установить	1	справа	
99	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+545	требуется установить	1		слева
100	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+625	требуется установить	1	справа	
101	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+629	требуется установить	1		слева
102	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+639	требуется установить	1	справа	
103	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+643	требуется установить	1		слева
104	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+881	требуется установить	1	справа	
105	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+885	установлено	1		слева
106	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+158	установлено	1	справа	
107	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+162	установлено	1		слева
108	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+643	требуется установить	1	справа	
109	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+647	требуется установить	1		слева
110	5.19.2	Пешеходный переход	2		2+015	требуется установить	1	справа	
111	5.19.2	Пешеходный переход	2		2+019	требуется установить	1		слева
112	5.23.1	Начало населенного пункта	2		0+000	установлено	1	справа	
113	5.24.1	Конец населенного пункта	2		0+000	установлено	1	справа	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Итого установлено:</b>					13		
		<b>Итого временных:</b>					0		
		<b>Итого демонтировать:</b>					1		
		<b>Итого требуется:</b>					33		
		<b>Итого:</b>					46		
		<b>Информационные знаки</b>							
113	6.4	Парковка (парковочное место)	2		1+158	требуется установить	1	справа	
114	6.4	Парковка (парковочное место)	2		1+190	установлено	1	справа	
115	6.8.1	Тупик	2		1+780	демонтировать	1	справа	
116	6.8.1	Тупик	2		1+960	требуется установить	1	справа	
117	6.16	Стоп-линия	2		0+622	требуется установить	1	справа	
118	6.16	Стоп-линия	2		0+648	требуется установить	1		слева
119	6.16	Стоп-линия	2		1+640	требуется установить	1	справа	
120	6.16	Стоп-линия	2		1+650	требуется установить	1		
121	6.22	Фотовидеофиксация	2		0+000	установлено	1	справа	
		<b>Итого установлено:</b>					1		слева
		<b>Итого временных:</b>					0		
		<b>Итого демонтировать:</b>					1		
		<b>Итого требуется:</b>					6		
		<b>Итого:</b>					7		
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>							
122	8.13	Направление главной дороги	2		1+775	требуется установить	1		примыкание слева
123	8.13	Направление главной дороги	2		1+755	требуется установить	1	справа	
124	8.13	Направление главной дороги	2		1+795	требуется установить	1		слева
125	8.17	Инвалиды	2		1+190	установлено	1	справа	
126	8.2.2.	Зона действия	2			установлено	2		слева
127	8.2.3.	Зона действия	2			установлено	2		слева
128	8.2.4.	Зона действия	2			установлено	2		слева
129	8.24	Работает эвакуатор	2			установлено	6		слева
		<b>Итого установлено:</b>					14		
		<b>Итого временных:</b>					0		
		<b>Итого демонтировать:</b>					0		
		<b>Итого требуется:</b>					3		
		<b>Итого:</b>					55		
		<b>Всего установлено:</b>					55		
		<b>Всего временных:</b>					0		
		<b>Всего демонтировать:</b>					8		
		<b>Всего требуется установить:</b>					74		
		<b>Всего:</b>					129		

## Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+110	1+160		33/33	1050	1050		Справа
2	1+160	1+940		16/16	780	780		Слева
3	1+980	2+020		2/2	40		40	Слева
Итого:				51/51	1870	1830	40	

**Ведомость наличия остановок общественного транспорта**

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+465	Справа	посадочная площадка, заездной карман	павильон	нет				
2	0+505	Слева	посадочная площадка, павильон, заездной карман		нет				
3	0+820	Справа	посадочная площадка, павильон, заездной карман		нет				
4	1+630	Слева	посадочная площадка, павильон, заездной карман		нет				
5	1+660	Справа	заездной карман	посадочная площадка, павильон	нет				
6	1+920	Слева	посадочная площадка, павильон, заездной карман		нет				

**Ведомость наличия светофорных объектов**

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+625	Пешеходный переход	0	1		Справа
2	0+625	Пешеходный переход	2	0		Справа
3	0+629	Пешеходный переход	0	1		Слева
4	0+645	Пешеходный переход	0	1		Слева
5	0+645	Пешеходный переход	2	0		Слева
6	1+643	Пешеходный переход	0	1		Справа
7	1+643	Пешеходный переход	1	0		Справа
8	1+647	Пешеходный переход	0	1		Слева
9	1+647	Пешеходный переход	1	0		Слева
Итого:			6	5		

**Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)**

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м		
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+110	0+478	Слева		368	368	
2	0+448	0+662	Справа		214		214
3	0+510	2+000	Слева		1490		1490
4	0+825	0+967	Справа		142		142
5	1+505	1+675	Справа		170		170
Итого:					2384	368	2016
